Responsable des installations: L. Rinolfi

CTF3 - Preliminary Phase

Version 4.3
16.02.2001

ID	Task Name	Dur.	Responsabl	Correspond.
4	**LPI hardware tests**	5d		
5	**LPI setting-up**	5d		
6	**Run in to Coldex, Photon-Scrubbing**	34d		
7	**Dismantle Coldex and Photon-Scrubbing**	4d		
8	**Start Shut-down for CTF3**	1d		
11	**General**	1d		
12	Re-arrange salle de Controle LPI	44d	B. Dupuy	
13	Debut commissionning	1d	L.Rinolfi	
14	Dessins EST section d'adaptation LIL, EPA	7w	EST	
16	Dessins EST section d'adaptation HIE, HIP	7w	EST	
17	Production des pièces pour LIL, EPA	8.4w	EST	
18	Production des pièces pour HIE, HIP	8.4w	EST	
19	**LIL**	1d		
20	Electricite - Mise en securite	3d	G.Cumer	G.Cumer
22	Ensemble des activites ST-HM-OP	104d		
23	Enlevement et tirage des cables	100d		
24	Deboucher les pare-feux dans galerie	3w	M.Poehler	K. Setas
25	Install porte 621+control d'acces	4w	R. Bonzano	R. Bonzano
27	Install porte 602(chicane)+control d'acces	1w	R. Bonzano	R. Bonzano
29	Enlevement sections LIL(ACS 11,12,13,14,25,26,35,36)	6w	P. Pearce	MDK/Vide
30	Install.section adaptation LIL-HIE	1w	L. Durieu	L. Durieu
31	Alignement aimants sect.adaptation LIL-HIE	2d	T.Dobers	T.Dobers
33	Enlever region cible e+	2w	G. Yvon	G. Yvon
34	Retraits cables region cible e+	2w	Pittin,Bossa	
35	Retraits cables RF	2w	R. Bossart	
36	Inst/Mod.guides d'ondes RF pour bunching	1w	G. Rossa	G. Rossat
37	Inst/Mod.guides d'ondes RF pour deflecteurs	6w	G. Rossa	G. Rossat
38	Canon CLIO (construction LAL)	184d	R. Pittin	R. Pittin
41	Cablages et interlocks canon CLIO	20d	R. Pittin	R. Pittin
44	Tests du canon au CERN avec interface+simulateur	15d	R. Pittin	R. Pittin
45	Tests avec sys.controle CERN avec interface+simulateur	15d	R. Pittin	R. Pittin
46	Canon CLIO tests HT au LAL	10d	R. Pittin	R. Pittin
47	Tests faisceau au LAL	20d	R. Pittin	R. Pittin
48	Clio GUN livre au CERN	1d	R. Pittin	R. Pittin
49	Demontage HT pour canon LIL	5d	R. Pittin	R. Pittin
50	Installation canon CLIO dans LIL	20d	R. Pittin	R. Pittin
51	Installation de l'eletronique CLIO dans galerie	10d	R. Pittin	R. Pittin
52	Tests eletronique, HT, local a distance	25d	R. Pittin	R. Pittin

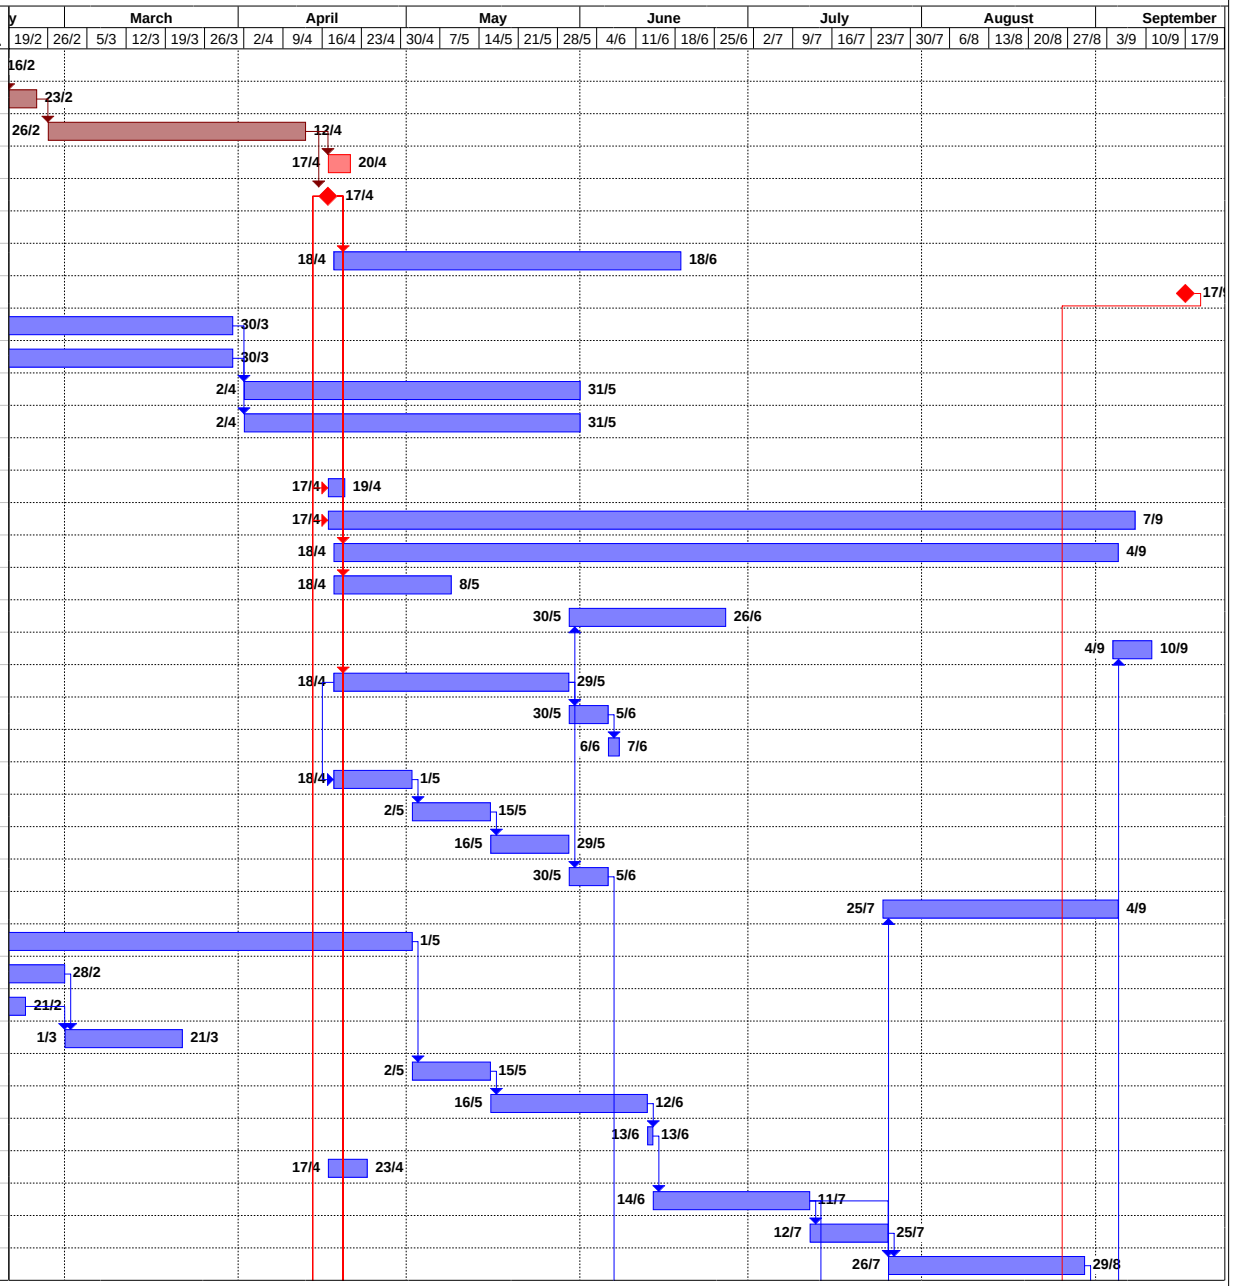

Responsable des installations: L. Rinolfi

CTF3 - Preliminary Phase

Version 4.3
16.02.2001
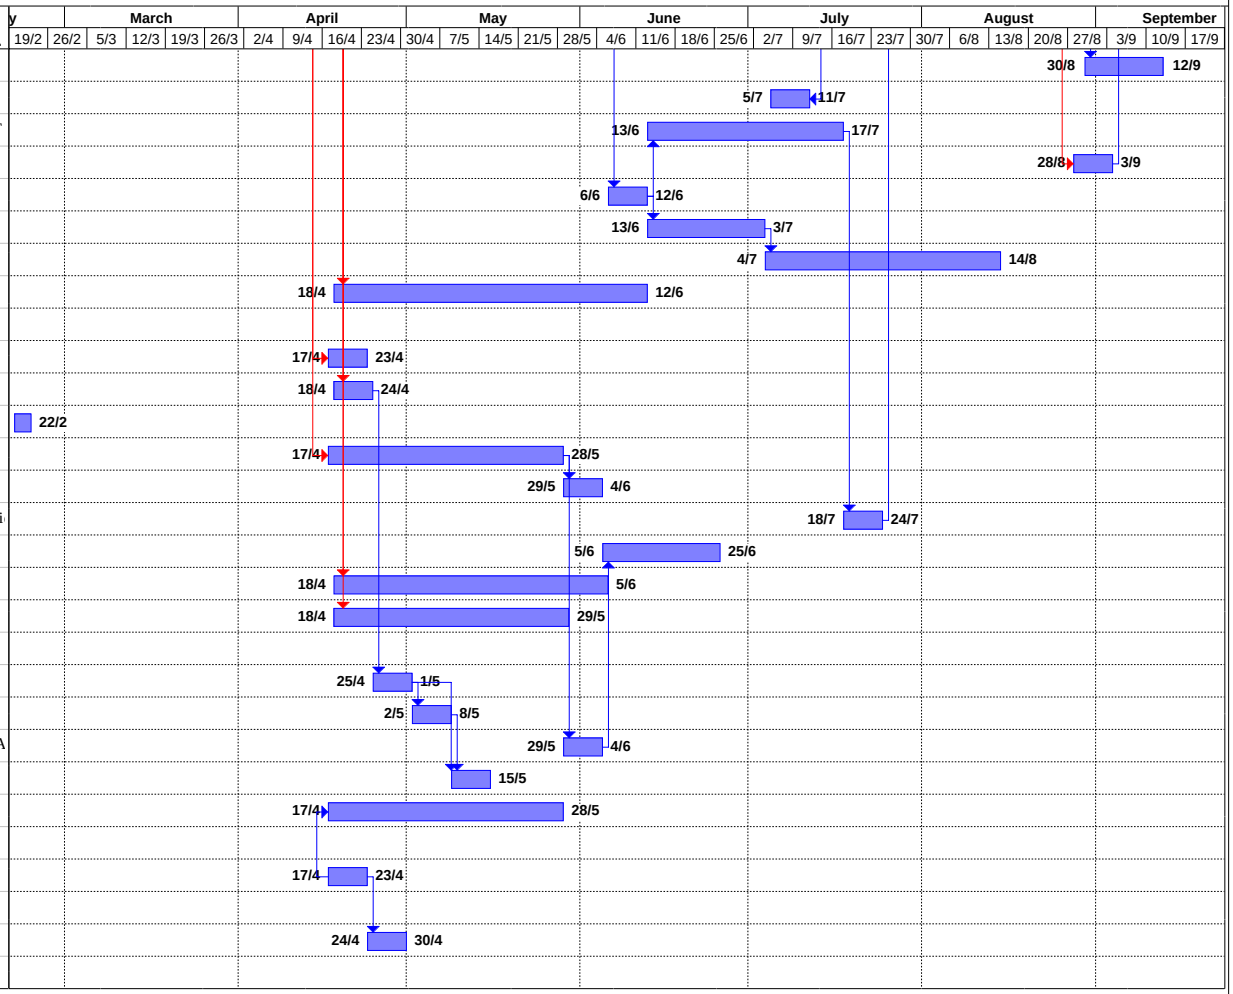
ID	Task Name	Dur.	Responsabl	Correspond.
53	Conditionnement	10d	R. Pittin	R. Pittin
54	Geometrie canon CLIO	1w	T.Dobers	T.Dobers
56	Deplacer bunching sys.+matching sect.vers sect.27	5w	G. Yvon	L.R. / RF / ST
57	Install blindage + chicane	1w	L. Durieu	M. Genolin
58	Install tuy.eau demin., cables, pour front-end sect.27	5d	G. Yvon	
59	Inst.diagnostic faisceau(WBS,MTV,)et streak camera	3w	U. Raich	J.C. Thomi
60	Inst. nouvelle ligne optique TMC36,TMC37	6w	U. Raich	
61	Cables signaux RF(ligne de ref.,mesures RF)	8w	R.Bossart	J.Mourier
63	**EPA**	1d		
66	Enlever septum extraction(SMH00)	1w	J. Borburgh	Vide
67	Enlever Kickers (e+) dans 31-49-51	1w	L. Sermeus	Vide
68	Modifier Kickers 11 d'injection (e+) en d'ejection (e-)	3d	L. Sermeus	J.C. Freze
69	Raccourcir circonférence EPA	6w	T. Risseladi	T. Dobers
70	Inst.diagnostic faisceau(WBS,MTV,....)	1w	U. Raich	
71	Install 2 RF deflecteurs (pas connecter)	1w	G. Rossa	G. Rossa / Vi
72	Deplacer Sextupole et QFW	3w	L. Durieu	L. Durieu
73	Inst.12 nouvelles alimentations	7w	J. Buttkus	R. Riva
74	Cablage pour 3 Q. type QFW, QFL, QTR	6w	M. Gaidon	M. Gaidon
76	**HIE + HIP (LIL - EPA transfer lines)**	1d		
77	Enlever ligne HIP(e+)partiellement	1w	L. Durieu	L. Durieu
78	Installation 2 Dumps	1w	L. Durieu	L. Durieu
79	Re-arrangement des aimants ligne HIE	1w	L. Durieu	T. Dobers / A
80	Install ligne spectrometre dans HIP	1w	T. Risseladi	T. Dobers
81	Nouveau diagnostic du faisceau	30d	U. Raich	
83	**HTE + HTP (EPA - PS tansfer lines)**	1d		
94	Enlever diagnostic faisceau 2eme.partie	5d	U. Raich	
96	**HME + HMP + HSE (MD's lines)**	1d		
98	Enlever diagnostic faisceau partie HME	5d	U. Raich	
102	**MDK work in CTF3 - preliminary phase**	1d
